

Sachstandsbericht Straßenbaumaßnahmen

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
01.08.2023

Investitionen

Rethmar West
Friedhofstraße/Papenteich
Wiesenstraße/Rosenstraße Heckenweg
Chausseestraße

Unterhaltung

Oberflächenbehandlung
Schneidebruch
Maßnahmen Dritter
Zusammenarbeit SWS/Stadt

Ausblick

Rethmar West

Der Endausbau des 1. BA umfasst :

Vorwerksgarten, Backhausfeld,
Am Sortenamt, Anschluss Poststraße

Wesentliche Leistungen :
6500 m² Pflasterarbeiten,
2485 m Bordanlagen,
1105 m Entwässerungsrinnen und
25 Straßenlaternen

Auftragswert : 865.000,00 €

Auftragnehmer : Fa. Degenhard

Status : Straße „Am Sortenamt“ bereits
komplett gepflastert, im Backhausfeld
Gehweg gepflastert, die Bordanlage gesetzt.
Pflasterarbeiten beginnen in Kürze.
voraussichtliches Bauende Oktober 2023.



Friedhofstraße/Papenteich

Grundhafte Erneuerung der Friedhofstraße (ca. 360 m) und Papenteich (125 m)

Wesentliche Leistungen :

1800 m² Asphaltarbeiten, 1700 m Bordanlagen, 870 m Entwässerungsrinnen, RW-Kanal ca. 500 m, Trinkwasserleitung ca. 500 m und Hausanschlüsse.

Auftragswert (Stadt Sehnde): 1.010.000,00 €

Auftragnehmer : Saatmann GmbH

Status : Die Arbeiten in der Straße Papenteich sind abgeschlossen. In der Friedhofstraße sind die Arbeiten für die SWs (RW-Kanal und Trinkwasserleitung) abgeschlossen. Zur Zeit werden die Aufpflasterungen an der B 65 vorgenommen und ab 17.08.2023 wird der Asphalt komplett eingebaut. Die Baustelle wird Anfang September abgeschlossen sein.



Wiesenstraße/Rosenstraße Heckenweg

Grundhafte Erneuerung

Wiesenstraße (ca. 200 m)

Rosenstraße (ca. 240 m)

Heckenweg (ca. 110 m)


Wesentliche Leistungen :

3600 m² Pflasterarbeiten, 850 m Bordanlagen, 600 m Entwässerungsrinnen . SW- und RW- Kanal ca. 600 m, Trinkwasserleitung ca. 600 m und Hausanschlüsse.

Auftragswert (Stadt Sehnde): 875.000,00 €

Auftragnehmer : Beton- und Monierbau GmbH

Status : In der Wiesenstraße sind die SW- und RW-Kanäle verlegt worden. Ebenso ist die Trinkwasserleitung erneuert worden. Die Hausanschlüsse sind dementsprechend mit verlegt worden. Für den Straßenbau ist in der Wiesenstraße der Unterbau hergestellt und die Steinsetzarbeiten haben begonnen.

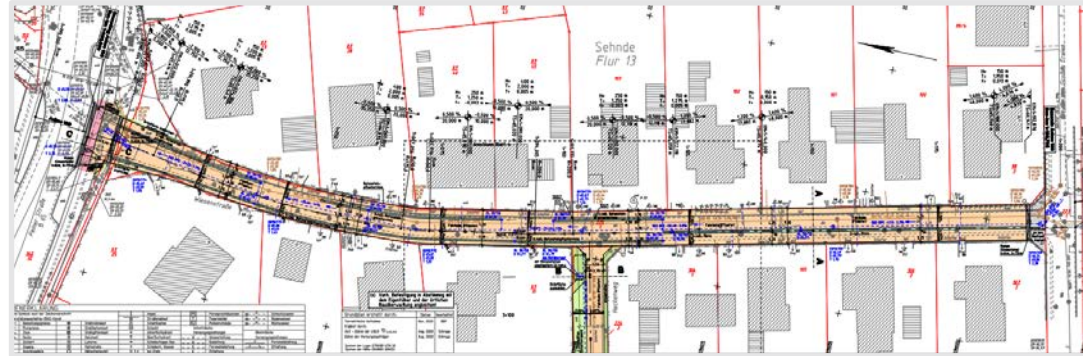


Chausseestraße

Wesentliche Leistungen :

1600 m² Pflaster als Hochplateau, 900 m² Pflasterarbeiten Gehwegbereich,
3000 m² Asphaltstraße, 450 m² wassergebundene Decke, 1300 m Bordanlagen,
200 m² Entwässerungsrinnen, Pflanzung von 9 Bäumen,
800 m² Entwässerungsmulden und 8 Straßenlaternen
600 m Regenwasserhauptkanal incl. der Hausanschlüsse und ca. 110 m
Schmutzwasserhauptkanal und die Trinkwasserleitung wurden neu verlegt.

Auftragswert : 1.213.000,00 € (Anteil Stadt)
Auftragnehmer : Fa. Bertram



Status : Die Arbeiten der Stadtwerke Sehnde sind abgeschlossen. Bordanlagen sind hergestellt und die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen. Zur Zeit finden Arbeiten im Gehwegbereich statt. Anschließend werden noch die Pflasterarbeiten für das Hochplateau geleistet. Sämtliche Arbeiten werden im September 2023 abgeschlossen sein.



Im Rahmen der STU werden folgende Straßen mit DSK vorgesehen		
Emmanuel-Kant-Straße	OT Sehnde	
Friedrich-Schlegel-Straße	OT Sehnde	
Schoppenhauerweg	OT Sehnde	
Hegelstraße	OT Sehnde	

Wesentliche Maßnahme:
Deckensanierung Schnedebruch



Schäden:
Netzrisse verstärkt
in den Kurven
Spurrinnen

Sanierung:
Abfräsen Deckschicht
Reinigen
Herstellung Schichtverbund
Verlegung Asphaltbewehrung
Optional Ansprühen
Einbau Deckschicht 3,5 cm

Kosten: ca. 150.000,- €



Abb. 3 Risse mit Rissverästelungen

htp Glasfaser

NLStbV B 443 Sanierung

DB Bahnübergang Bolzum

Region Brücke Bruchriede

Avacon, Telekom

" Schnelles Internet" htp (Arbeiten Fa. Tavan ab 01.09.2021)				
Ort	Trassenlänge in m	Bem.		
Rethmar	14.250	Abnahme erfolgt, Nachabnahme erforderlich		
Evern	4.936	Abnahme erfolgt, Nachabnahme erforderlich		
Dolgen	4.300	Abnahme erfolgt, Nachabnahme erforderlich		
Haimar	6.550	Abnahme erfolgt, Nachabnahme erforderlich		
Sehnde Nord	10.535			
Sehnde West	12.121			
Sehnde Süd	16.750			
Ilten	21.150			
Höver	8.250			
Wassel	5.500			
Klein Lobke	3.650			
Gretenberg	1.356			
	109.348			
Müllingen/Wirringen/Wehmingen/Bolzum/Bilm wurden die Arbeiten durch Fa. Visco abgearbeitet.				
Zur Zeit finden immer noch "Nachverdichtungsarbeiten" statt.				

K143 : Neubau Radweg zwischen Bilm und Wassel

Auftraggeber : Region Hannover

Das Bauvorhaben umfasst den Radwegneubau im Zuge der Kreisstraße 143 zwischen den Ortschaften Bilm und Wassel in der Stadt Sehnde.

Es beinhaltet u.a. folgende auszuführenden Hauptleistungen :

- Herstellen eines 2,50 m breiten Radweges in Asphalt bzw. Pflasterbauweise
- Wiederherstellung von Wegeeinmündungen in Asphalt bzw. Pflasterbauweise
- Herstellung einer Querungshilfe an den Ortsgrenzen Bilm und Wassel.
- Natursteinpflaster zur Sohlsicherung in Ein- und Ausfahrten von Grabenverrohrungen für Feldzufahrten, Straßeneinmündungen und die angeschlossenen Wege
- Liefern und Aufstellen von Verkehrszeichen
- Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen

Zusammenarbeit SWS/Stadt

Straßenrahmenvertrag Stadt Sehnde

Auftrags-Nr.	Status	Auftragsdatum	Ausführungsdatum	Unfallgefahr	Ansprechpartner	Art	Sonstiges	Ort	Straße	Hausnr.
12	offen	02.09.2022		Ja	Ulrich Jahnke	Pflasterarbeiten		Ilten	Am Park	
23	erledigt	22.09.2022	27.09.2022		Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Müllingen	Alte Schmiede	
35	erledigt	05.10.2022	17.10.2022		Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Ilten	Stettiner Str.	
38	erledigt	25.10.2022	24.10.-15.11.2022	Ja	Jörg Engelhardt	Grundstückszufahrten		Höver	Gretlade	5
39	erledigt	25.10.2022	14.11.2022		Jörg Engelhardt	Pflasterarbeiten		Wehmingen	Dr.-Sauer-Str.	
40	erledigt	25.10.2022	14.11.-18.11.2022		Jörg Engelhardt	Sonstiges	Bankette auffüllen und G	Wehmingen	Wasseler Weg	
41	erledigt	25.10.2022	02.11.2022		Jörg Engelhardt	Pflasterarbeiten		Wehmingen	Von-Wemighe-Str.	35
42	erledigt	25.10.2022	03.11.-07.11.2022		Jörg Engelhardt	Straßenabläufe		Wehmingen	Im Buchenkamp	9
43	erledigt	25.10.2022	27.10.-01.11.2022		Jörg Engelhardt	Grundstückszufahrten		Höver	Gretlade	11
45	erledigt	27.10.2022	22.11.2022	Ja	Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Haimar	Schmiedeberg	
51	erledigt	04.11.2022	21.02.2023	Ja	Ulrich Jahnke	Pflasterarbeiten		Ilten	Hugo-Remmert-Str.	
57	erledigt	15.11.2022	05.12.-09.12.2022	Ja	Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Sehnde	Gluckweg	
60	erledigt	15.11.2022	29.11.2022		Ulrich Jahnke	Pflasterarbeiten		Sehnde	Werner-Höchstädt-Str.	
62	offen	02.12.2022			Jörg Engelhardt	Pflasterarbeiten	Wegeoberflächen überarb	Sehnde	Raiffeisenstr.	21
67	erledigt	22.12.2022	25.01.-08.02.2023		Ulrich Jahnke	Straßenabläufe		Rethmar	Backhausfeld	
190	erledigt	07.07.2023	28.07.2022		Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Ilten	Glückauf Str.	
191	erledigt	07.07.2023	26.07.2022		Jörg Engelhardt	Straßenabläufe		Bolzum	Boltessemstr.	
192	erledigt	07.07.2023	30.06.2022		Jörg Engelhardt	Pflasterarbeiten		Bolzum	Marktstr.	7
193	erledigt	07.07.2023	01.07.2022		Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Bolzum	Im Wehmfeld	1
194	erledigt	07.07.2023	10.05.-16.05.2022		Jörg Engelhardt	Sonstiges	Gossensanierung	Wehmingen	Heinrichstr.	
195	erledigt	07.07.2023	15.07.2022		Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Rethmar	Poststr.	
196	erledigt	07.07.2023	07.03.2023		Jörg Engelhardt	Sonstiges	Gefahrstelle absperren	Ilten	Tannenweg	
197	erledigt	07.07.2023	04.04.2022		Jörg Engelhardt	Sonstiges	Umsetzung RW-/SW-Scha	Dolgen	Ost-West-Str.	
198	offen	24.07.2023			Jörg Engelhardt	Pflasterarbeiten		Sehnde	Karl-Backhaus-Ring	
199	offen	24.07.2023			Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Sehnde	Raiffeisenstr.	
200	offen	24.07.2023			Jörg Engelhardt	Schlaglöcher		Rethmar	Dorfstr.	

Vertrag seit
Juli 2022

Inzwischen 200
Maßnahmen

Volumen ca.
236.000,- €/a

Abwicklung hat
sich bewährt!

Geplante Bauvorhaben 2024 - 2026		
2024	2025	2026
Bergstraße	Im Wehmfeld	Breite Straße
Gartenstraße	Berbohmskamp	Ostlandstraße
Nelkenstraße	Boltessemstraße	Maschwiese
Eichstraße	Sängergasse	Erbenholzweg
Alemanieweg	Schmiedeberg	
Die Maßnahmen 2024 werden in diesem Jahr geplant und Anfang 2024 in den Gremien vorgestellt.		

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
